

**Comune di Ruvo di Puglia - Corato - Andria**  
Provincia di BA

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:**

ALLESTIMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI JAZZO ROSSO - S. MAGNO - CASTEL DEL MONTE

**COMMITTENTE:** ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

**CANTIERE:** Strade ricadenti nei territori dei Comuni di Ruvo di Puglia, Corato ed Andria,  
Ruvo di Puglia - Corato - Andria (BA)

Ruvo di Puglia - Corato - Andria, 10/08/2011

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(GEOMETRA BOMBINO LUIGI PASQUALE)

---

*per presa visione*  
**IL COMMITTENTE**  
(DIRETTORE f.f. MODESTI FABIO)

---

GEOMETRA BOMBINO LUIGI PASQUALE  
VIA FIRENZE 10  
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)  
080 3262268 - 0803261767  
luigibombino@parcoaltamurgia.it



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	1	2	2	07/06/2010	08/06/2010
	3	1	2	2	12/06/2010	13/06/2010
	4	1	2	2	28/06/2010	29/06/2010
	5	1	2	2	14/07/2010	15/07/2010
	6	1	2	2	31/07/2010	01/08/2010
	7	1	2	2	18/08/2010	19/08/2010
	8	1	2	2	04/09/2010	05/09/2010
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	1	1	1	09/06/2010	09/06/2010
	3	1	1	1	14/06/2010	14/06/2010
	4	1	1	1	30/06/2010	30/06/2010
	5	1	1	1	16/07/2010	16/07/2010
	6	1	1	1	02/08/2010	02/08/2010
	7	1	1	1	20/08/2010	20/08/2010
	8	1	1	1	06/09/2010	06/09/2010
Ripristino di muri a secco	3	1	10	10	18/06/2010	27/06/2010
	4	1	10	10	04/07/2010	13/07/2010
	5	1	10	10	20/07/2010	29/07/2010
	6	1	10	11	06/08/2010	16/08/2010
	8	1	9	9	10/09/2010	18/09/2010
Manutenzione Sentieri	3	1	8	8	13/06/2010	20/06/2010
	4	1	7	7	01/07/2010	07/07/2010
	5	1	6	6	17/07/2010	22/07/2010
	6	1	6	6	03/08/2010	08/08/2010
	7	1	6	6	21/08/2010	26/08/2010
	8	1	6	6	07/09/2010	12/09/2010
Posa di segnaletica stradale verticale	2	1	2	2	10/06/2010	11/06/2010
	3	1	2	2	26/06/2010	27/06/2010
	4	1	2	2	13/07/2010	14/07/2010
	5	1	2	2	29/07/2010	30/07/2010
	6	1	2	2	16/08/2010	17/08/2010
	7	1	2	2	02/09/2010	03/09/2010
	8	1	2	2	19/09/2010	20/09/2010
Sistemazione di aree di sosta previo lo spandimento il livellamento e la ricarica con stabilizzato di cava	1	1	10	10	21/09/2010	30/09/2010
Posa di panchine, cestini, tavoli e portabici	1	1	10	10	21/09/2010	30/09/2010
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	1	2	2	10/06/2010	11/06/2010
	3	1	2	2	26/06/2010	27/06/2010
	4	1	2	2	13/07/2010	14/07/2010
	5	1	2	2	29/07/2010	30/07/2010
	6	1	2	2	16/08/2010	17/08/2010
	7	1	2	2	02/09/2010	03/09/2010
	8	1	2	2	19/09/2010	20/09/2010

Spalcatura di piante	3	1	6	6	21/06/2010	26/06/2010
	4	1	6	6	07/07/2010	12/07/2010
	5	1	6	6	23/07/2010	28/07/2010
	6	1	6	6	09/08/2010	14/08/2010
	7	1	6	6	27/08/2010	01/09/2010
	8	1	6	6	13/09/2010	18/09/2010

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

2) = Zona 1

3) = Zona 2

4) = Zona 3

5) = Zona 4

6) = Zona 5

7) = Zona 6

8) = Zona 7

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = Impresa appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Zona 1

Z3 = Zona 2


Z4 = Zona 3

Z5 = Zona 4


Z6 = Zona 5

Z7 = Zona 6


Z8 = Zona 7

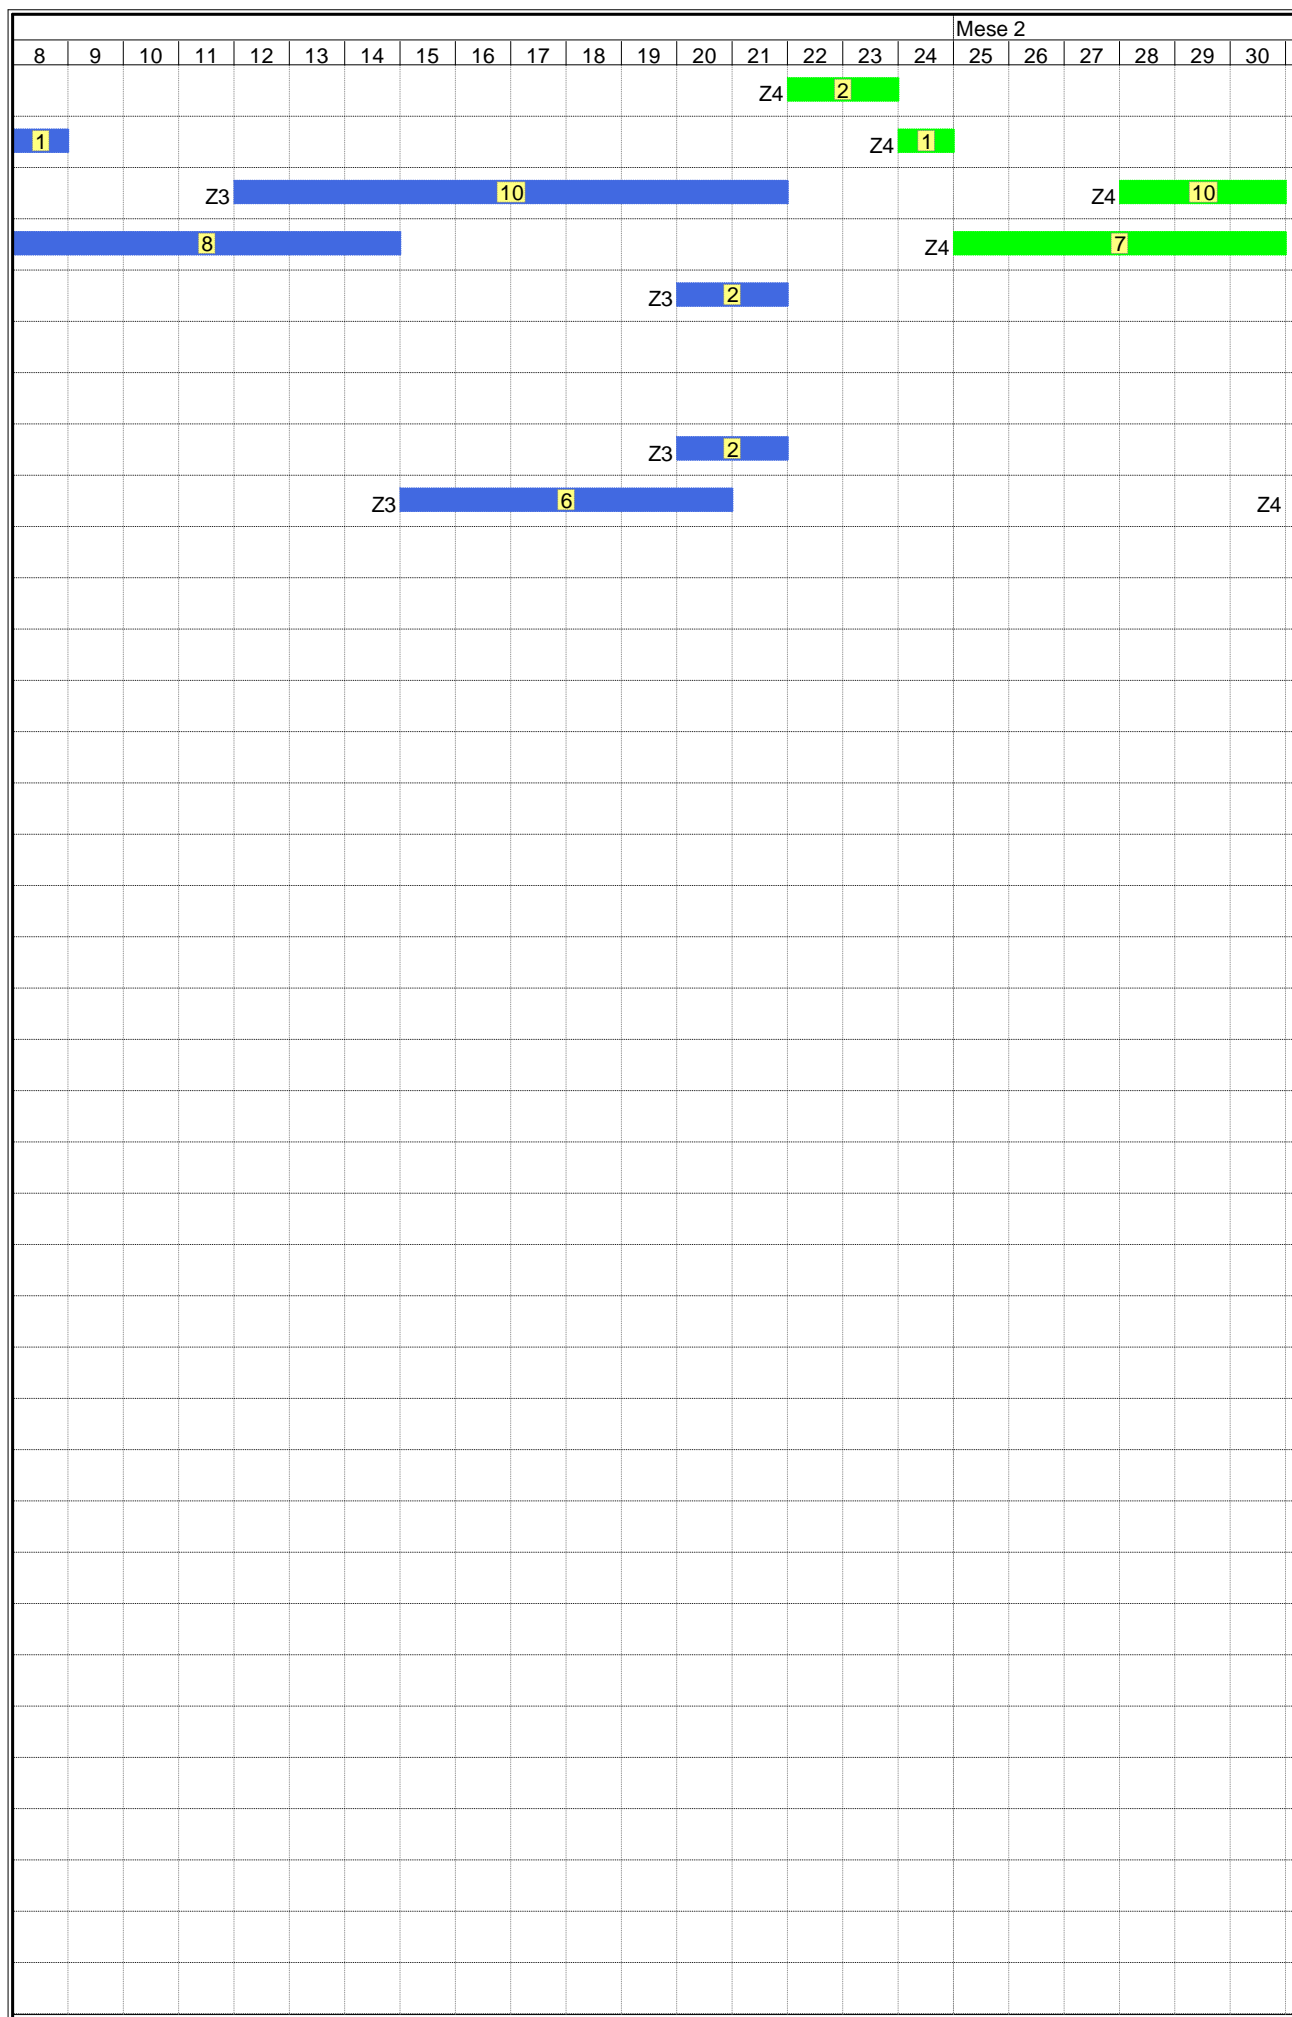



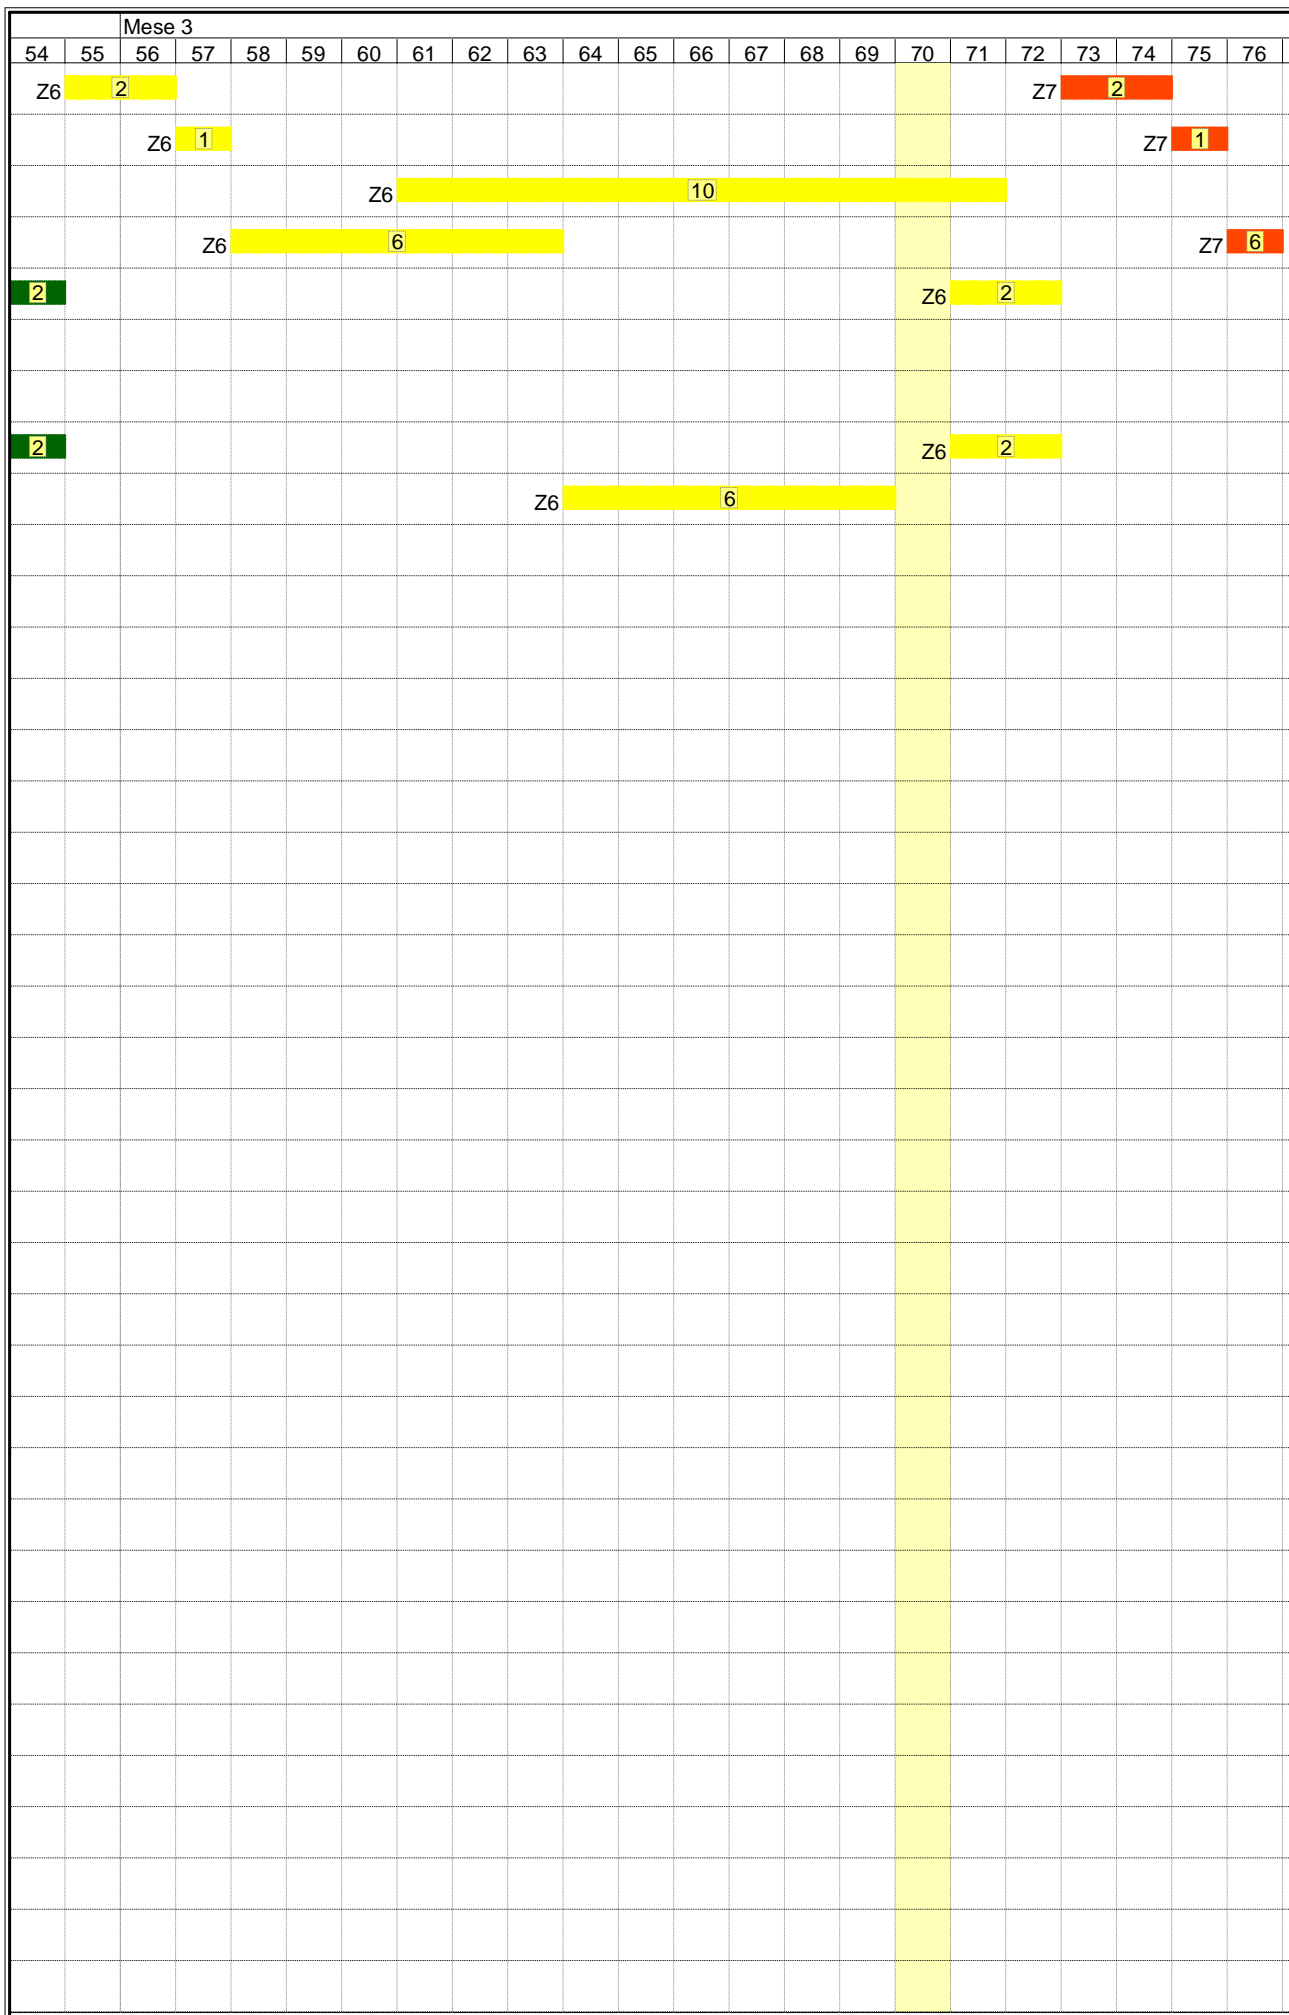



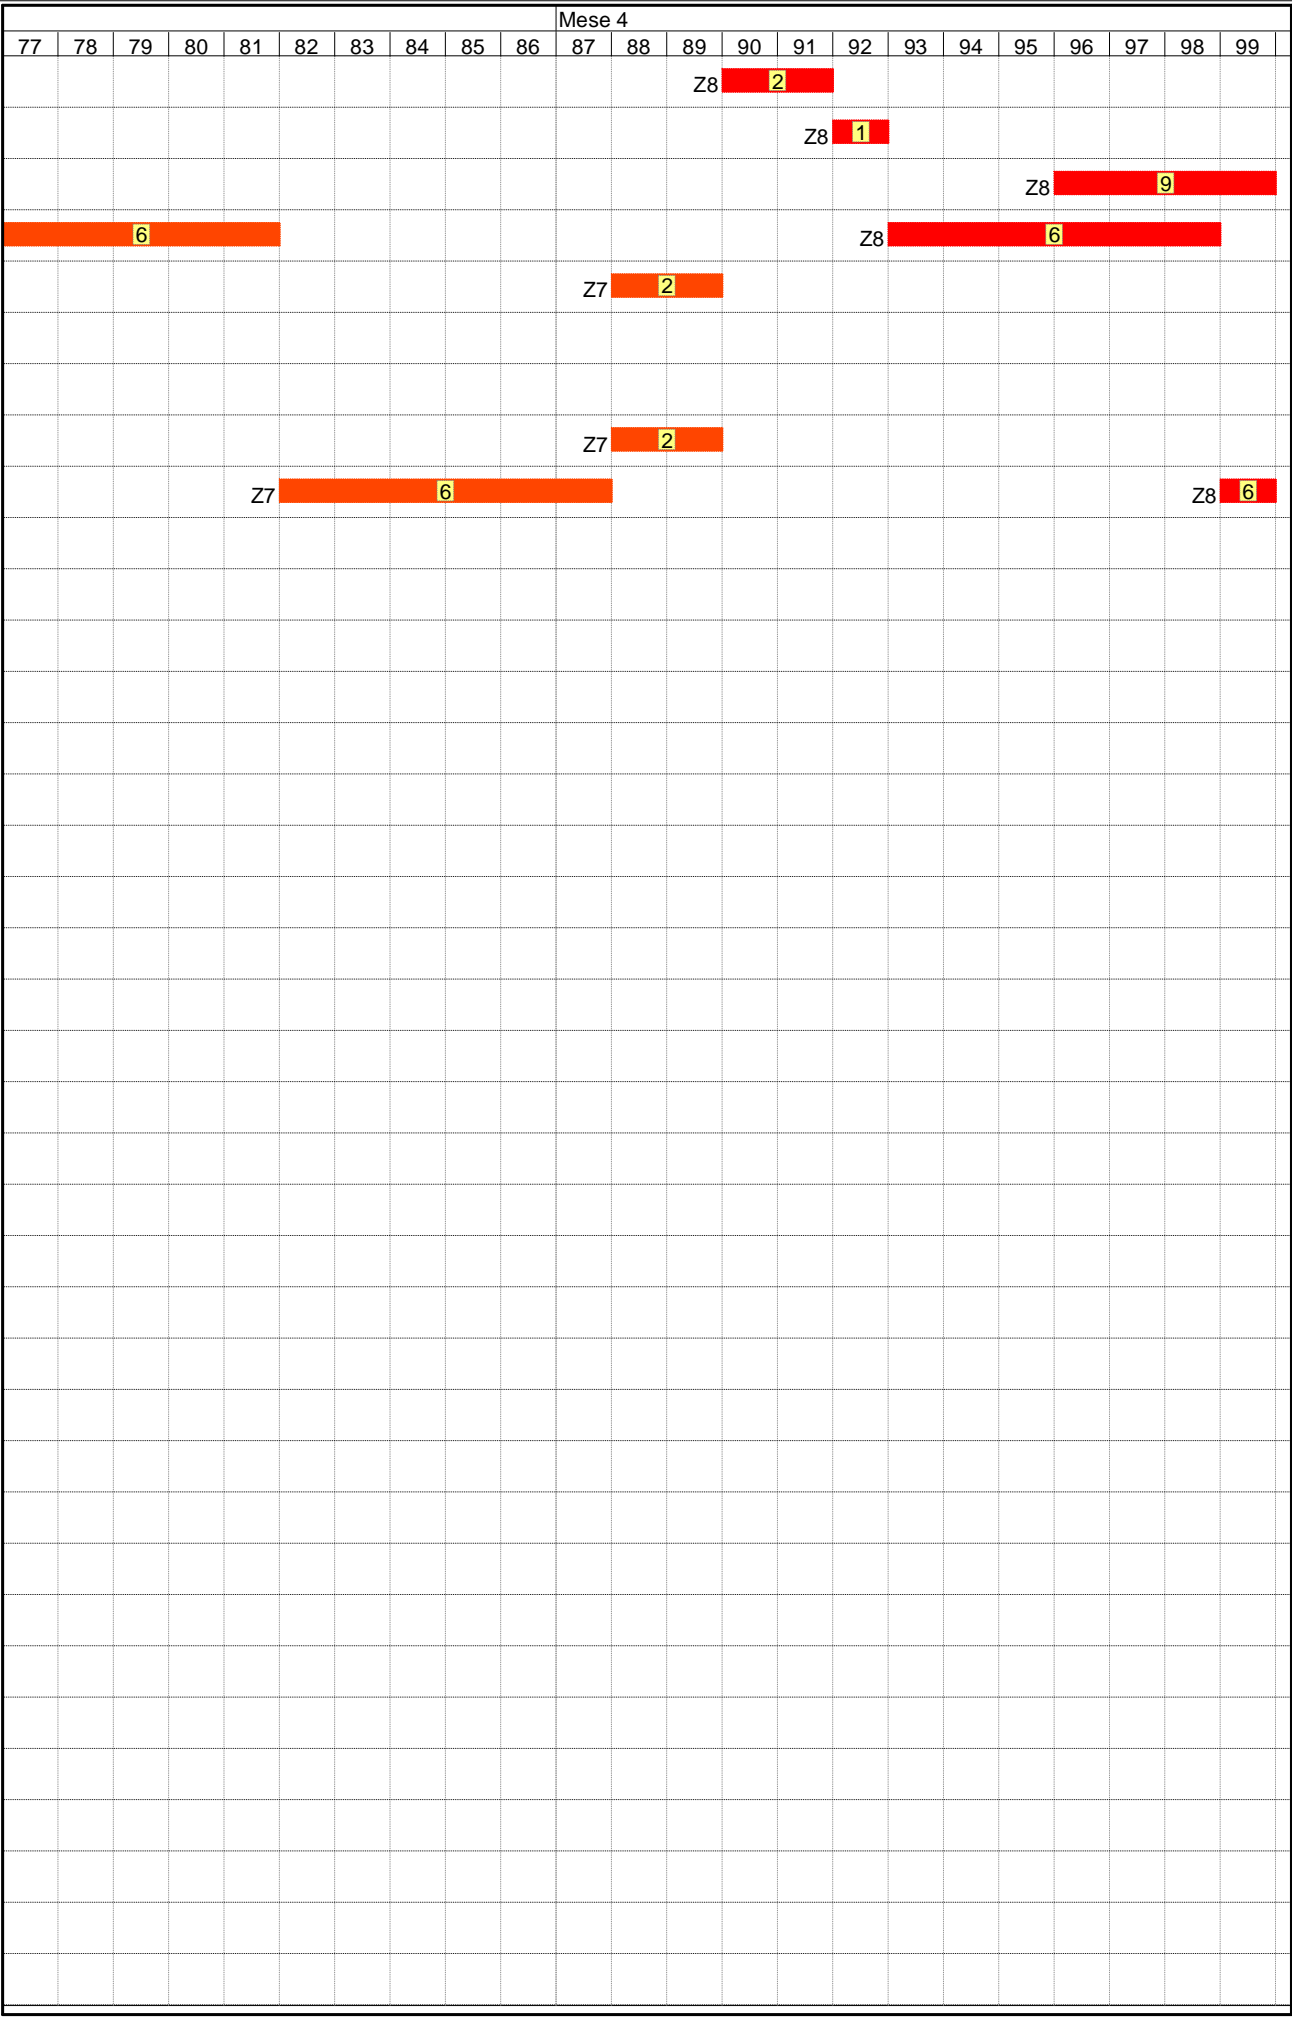

[illegible]
